

# 六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備

事業主体 六戸町  
計画期間 H21～H25


## ■計画の概要

### 計画の目標

通勤・通学のための安全で快適な道路通行を確保するとともに、各集落間及び各集落から公共施設・交流施設等がある町中心部へのアクセスの向上を図る。

### 成果目標

道路利用者が快適に感じる舗装の状態(※MCI>4)区間を増加させる。



※MCIとは・・・舗装の維持管理指数で  
・ひび割れ  
・わだち掘れ  
・平坦性  
の3つの要因を組み合わせ、舗装の破損程度を10点満点として総合的に判断した指数

### 事業内容

・六戸町における舗装補修、除雪事業及び除雪機械の購入

代表工区

- ▶古里沖山線外(舗装補修) L=3.3km
- ▶犬落瀬地区線外(舗装補修) L=3.0km
- ▶入口長谷線外(舗装補修) L=3.6km
- ▶古里沖山線外(凍結抑制剤散布車購入) N=1台
- ▶古里沖山線外(除雪) N=23.6km etc.

## ■中間評価の結果

### 事業実績

- ▶事業数による進捗 【計画全体6事業】  
着手率83.3%(5事業)、完了率33.3%(2事業)
- ▶完成した代表事例



整備前

古里沖山線外  
L=2.6km




整備後

整備効果

舗装補修により  
走行性が向上

### 成果目標(H23末)の達成状況

快適に感じる舗装状態の道路延長割合%  
(=MCI>4の道路延長/全体延長)

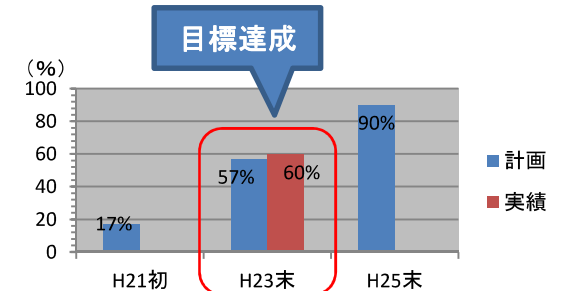

目標達成

## ■今後の方針

中間目標を概ね達成できた。早期の事業完了を目指し、最終目標も達成できるよう引き続き事業の進捗を図る。
